

Strumenti digitali al servizio del Project Manager: il CDE per la gestione dei flussi informativi nel processo edilizio

Michele Carradori

PM
expo
2024



Istituto Italiano di
Project Management

presenta:

PMexpo

Roma, 4 Ottobre 2024



Michele Carradori

Contec Ingegneria s.r.l.

BIM Manager

michele.carradori@contec-srl.it

BIS-lab® - Building Innovation and Skills-Lab®

Direttore del laboratorio

michele.carradori@bis-lab.eu

 [LinkedIn](#)





società d'ingegneria fondata nel 1962
eroga **servizi** nelle diverse fasi del **processo edilizio**
si compone di circa **40 collaboratori**,
principalmente **ingegneri e architetti**

SERVIZI PRINCIPALI

progettazione integrata
multidisciplinare e BIM-based

direzione lavori

project &
construction management

consulenza in ambito
facility management

verifica della
progettazione

analisi del valore





Contec Ingegneria opera in
conformità a Sistema di gestione
qualità certificato da:
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



Associazione delle organizzazioni
di ingegneria, di architettura e di
consulenza tecnico-economica

Federazione internazionale dei
consulenti di ingegneria

Confederazione generale
dell'industria italiana

Ente nazionale italiano di
unificazione



Green Building Council
Italian chapter



Development of the sustainability
and the circular economy
through ESIndex®



Federazione italiana per l'uso
razionale dell'energia



International Facility Management
Association - *Italian chapter*



Associazione italiana per lo sviluppo
BIM - *Founding partner*



Ingegneria sismica italiana



Associazione italiana dei giuristi
di diritto immobiliare



Associazione italiana per il restauro



presenta:
PMexpo
Roma, 4 Ottobre 2024





contec


GRUPPO



presenta:
PMexpo
Roma, 4 Ottobre 2024




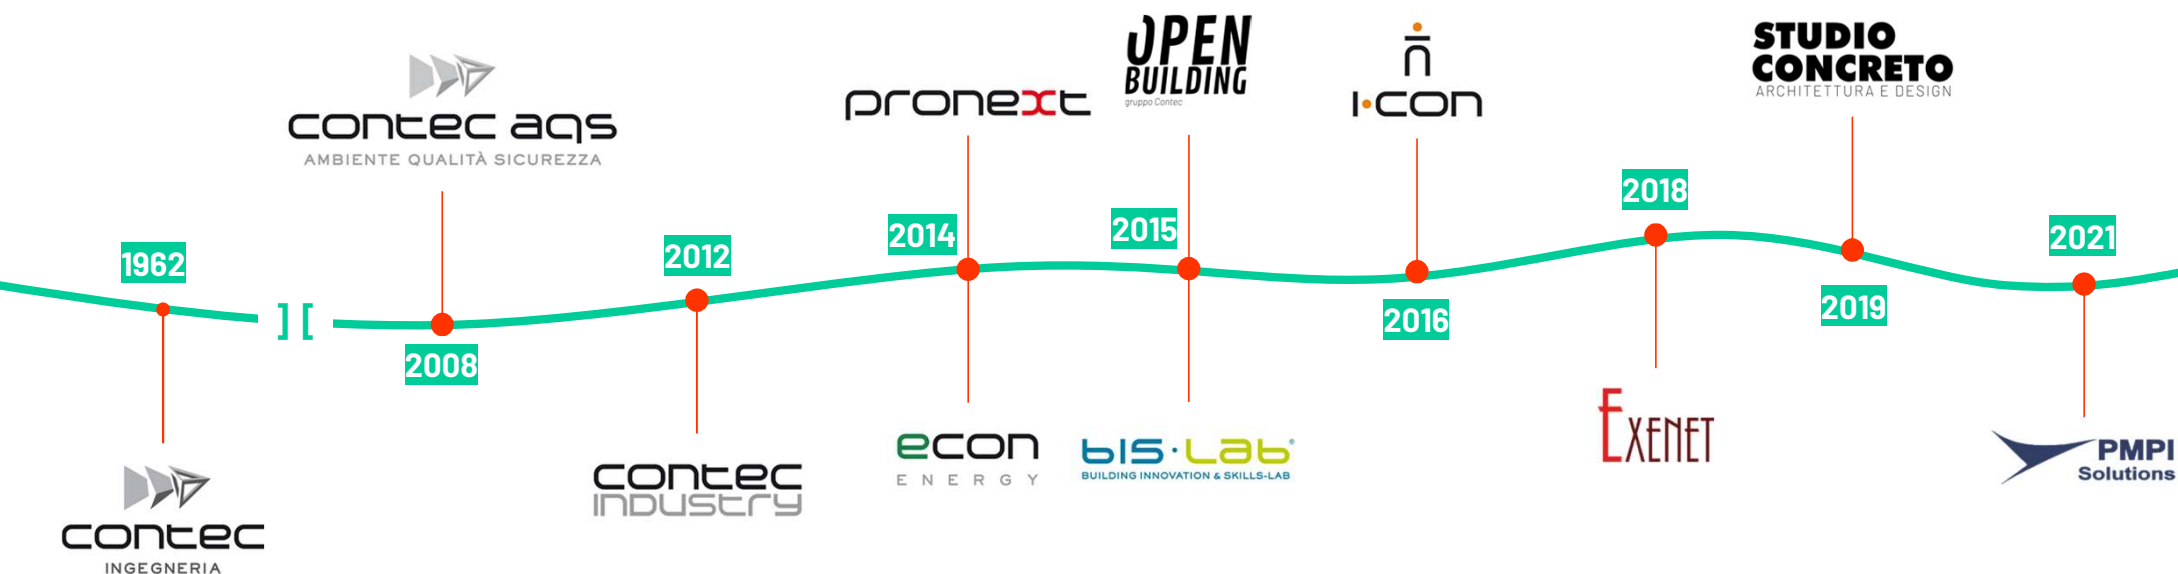

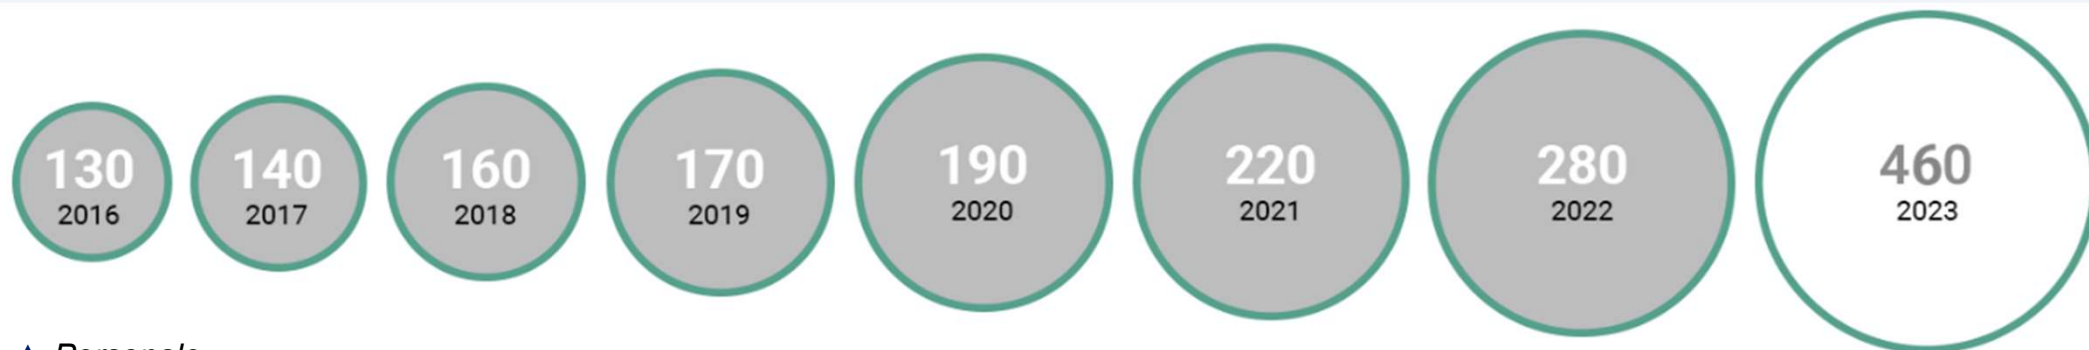

▲ *Personale*

▼ *Fatturato*

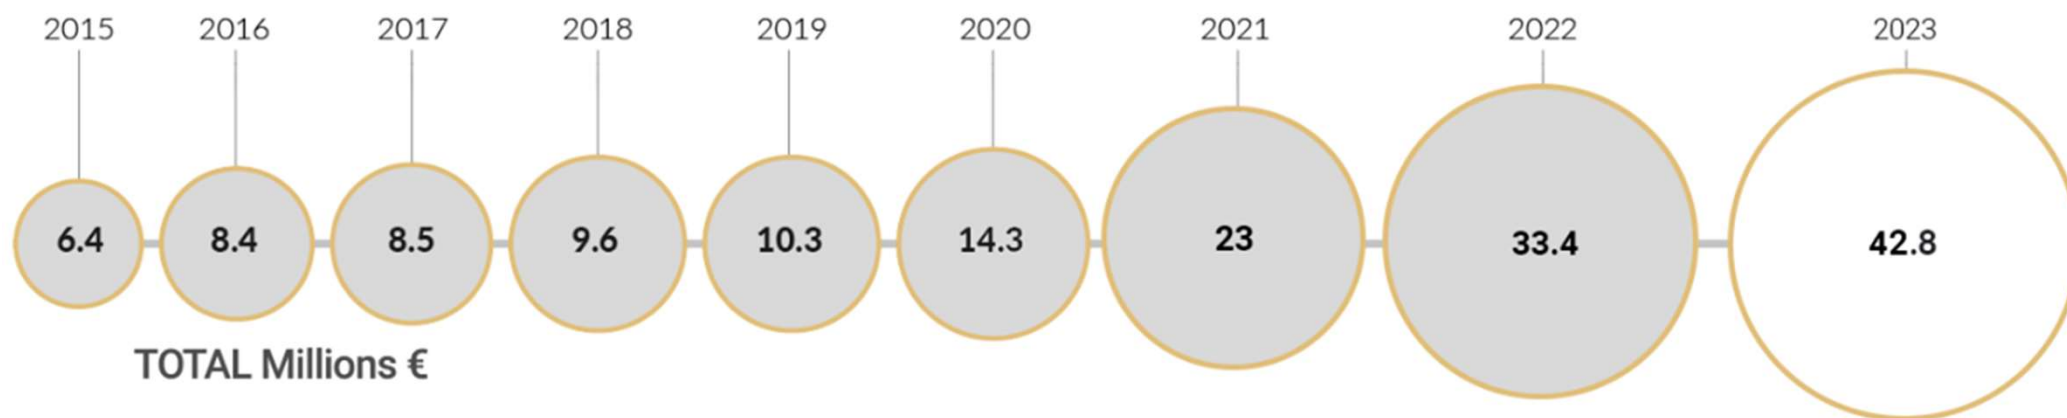

INDICE


- costruzioni e innovazione: la **metodologia BIM**
- il **Common Data Environment (CDE)**
- il **CDE** in risposta alla **frammentazione del comparto**
- il **CDE** in risposta all'assenza di un **sistema integrato di gestione delle informazioni**
- **criticità** nell'uso del CDE

processo edilizio  innovazione

BIM

Building Information Modeling

*metodologia di lavoro improntata sulla gestione digitale dei flussi informativi di progetto,
che si fonda sull'utilizzo di modelli informativi tridimensionali, parametrici e relazionali,
sulla collaboratività e sull'interoperabilità*

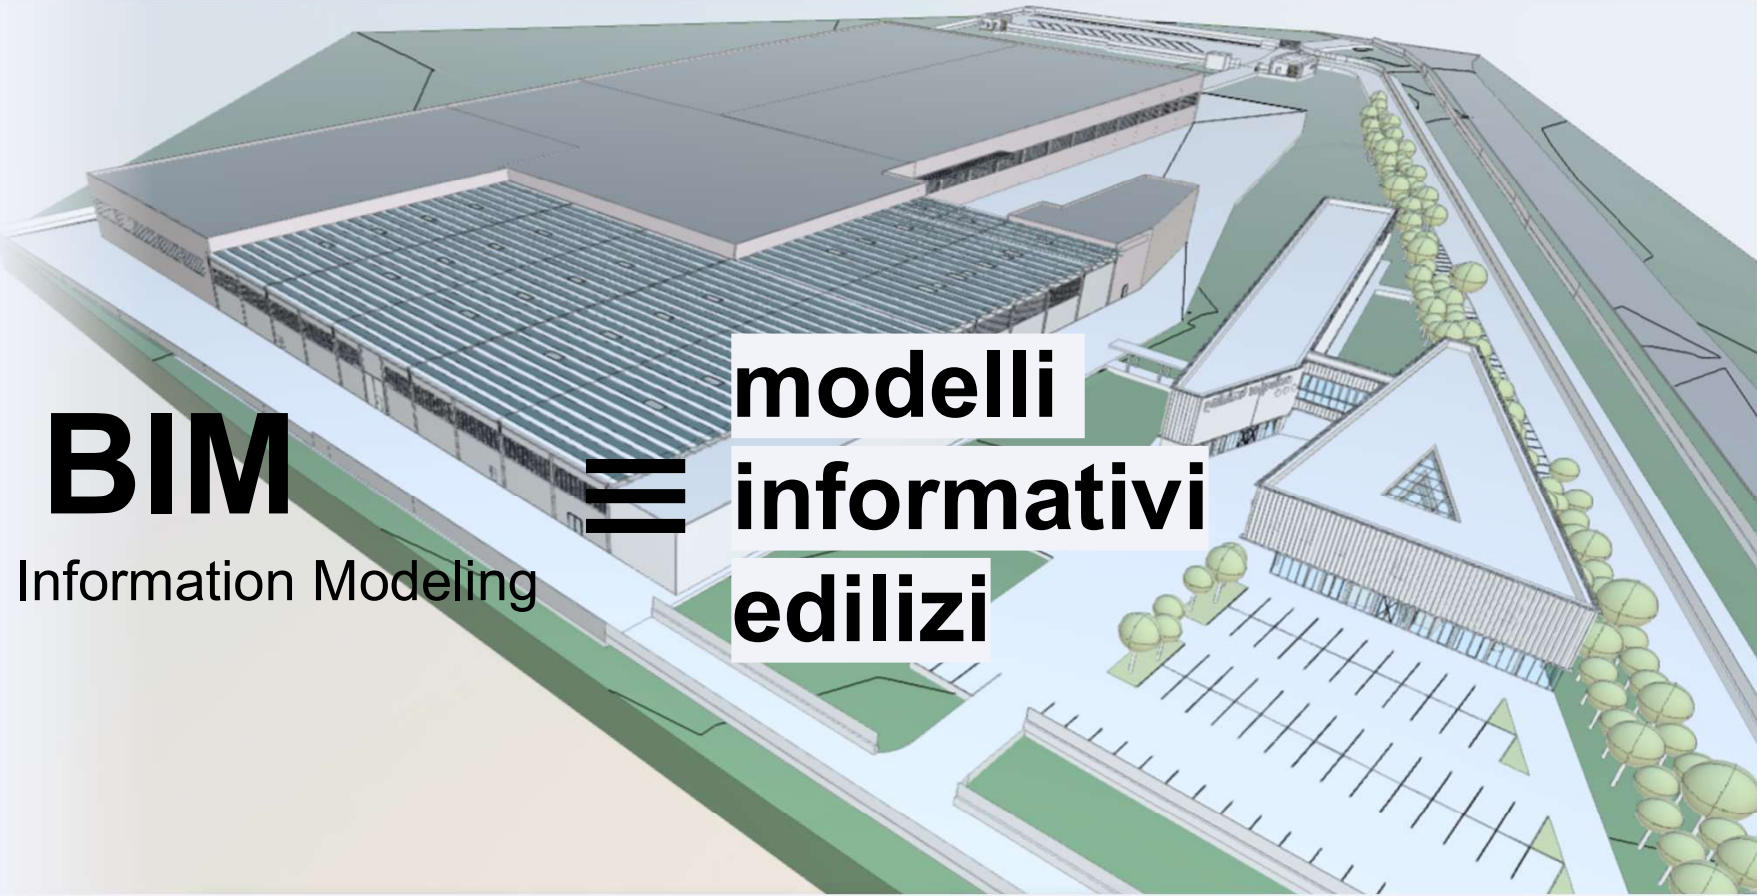

BIM

Building Information Modeling



modelli
informativi
edilizi

UNI 11337

Edilizia e opere di ingegneria civile

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

BIM

Building Information Modeling

modelli
≡ informativi
edilizi

UNI 11337

Edilizia e opere di ingegneria civile

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

Building Information



Source: <https://hbr.org/2016/04/a-chart-that-shows-which-industries-are-the-most-digital-and-why>
Report edited by McKinsey Global Institute

How Digitally Advanced Is Your Sector?

An analysis of digital assets, usage, and labor.



UNI 11337

Edilizia e opere di ingegneria civile

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

BIM

Building Information Modeling

modelli
≡ informativi
edilizi

UNI 11337

Edilizia e opere di ingegneria civile

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

BIM

~~Building Information Modeling~~

Better Information Management

modelli
≡ informativi
edilizi

UNI 11337

Edilizia e opere di ingegneria civile

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

BIM

~~Building Information Modeling~~

Better Information Management

≈ modelli
informativi
edilizi

**Common
+ Data
Environment**

Ambiente di
Condivisione dei Dati

da ISO 19650-1:2018
*“Agreed source of information for any given project or asset,
for collecting, managing and disseminating
each information container through a managed process.”*

da UNI 11337-1:2016
*“Ambiente di raccolta organizzata e condivisione
dei dati relativi a modelli ed elaborati digitali,
riferiti ad una singola opera
o ad un singolo complesso di opera.”*

Common + Data Environment

Ambiente di
Condivisione dei Dati

UNI 11337

Edilizia e opere di ingegneria civile

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

BIM


~~Building Information Modeling~~

Better Information Management

≈ **modelli
informativi
edilizi**

**Common
+ Data
Environment**

Ambiente di
Condivisione dei Dati

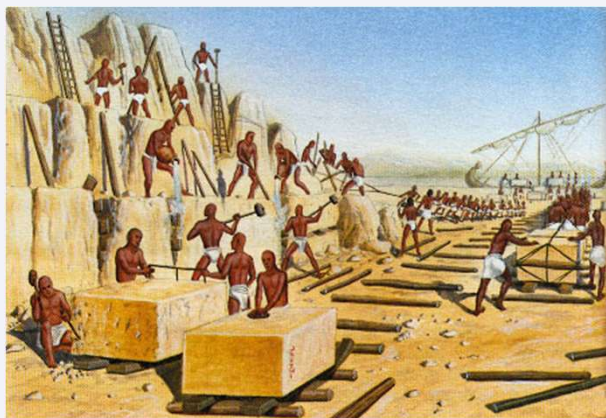


modelli
ativi

Co
+ Data

Environment

Ambiente di
Condivisione dei Dati

 **MATURITÀ DIGITALE DEL PROCESSO**

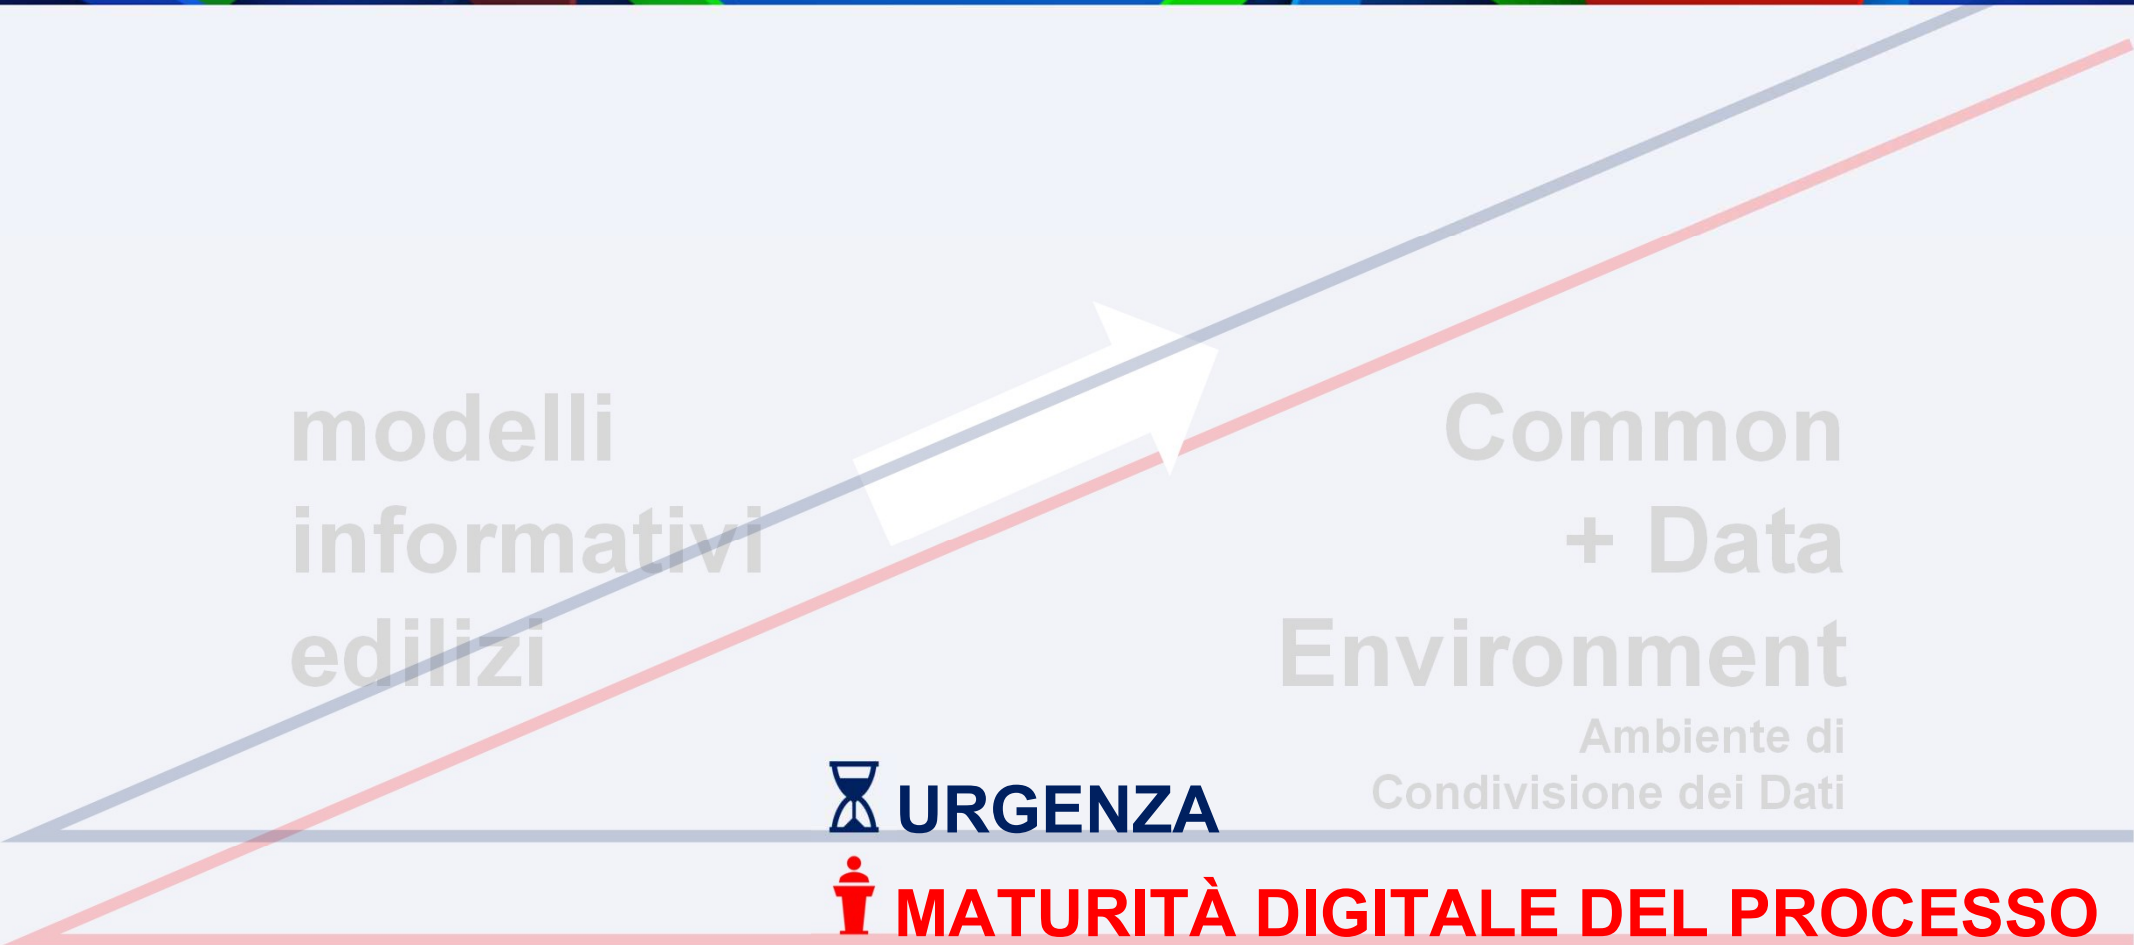

modelli
informativi
edilizi

Common
+ Data
Environment

Ambiente di
Condivisione dei Dati

 **URGENZA**

 **MATURITÀ DIGITALE DEL PROCESSO**

Common Data Environment

Ambiente di
Condivisione dei Dati

modelli
informativi
edilizi



URGENZA



MATURITÀ DIGITALE DEL PROCESSO

Common Data Environment

Ambiente di
Condivisione dei Dati

perché è così importante necessario?

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO EDILIZIO



produce
oggetti unici



è basato sulla
competitività
piuttosto che sulla
collaborazione



manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'**informazione**



è soggetto a
forti ciclicità



tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese



scarsi investimenti
in **research & development**

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO EDILIZIO



produce
oggetti unici



è basato sulla
competitività
piuttosto che sulla
collaborazione



manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'**informazione**



è soggetto a
forti ciclicità



tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese



scarsi investimenti
in **research & development**

→ **ACDat** [CDE] ←


CDE perché è così importante necessario?

ACDat

tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese

> tanti operatori

> tanti operatori **non strutturati**

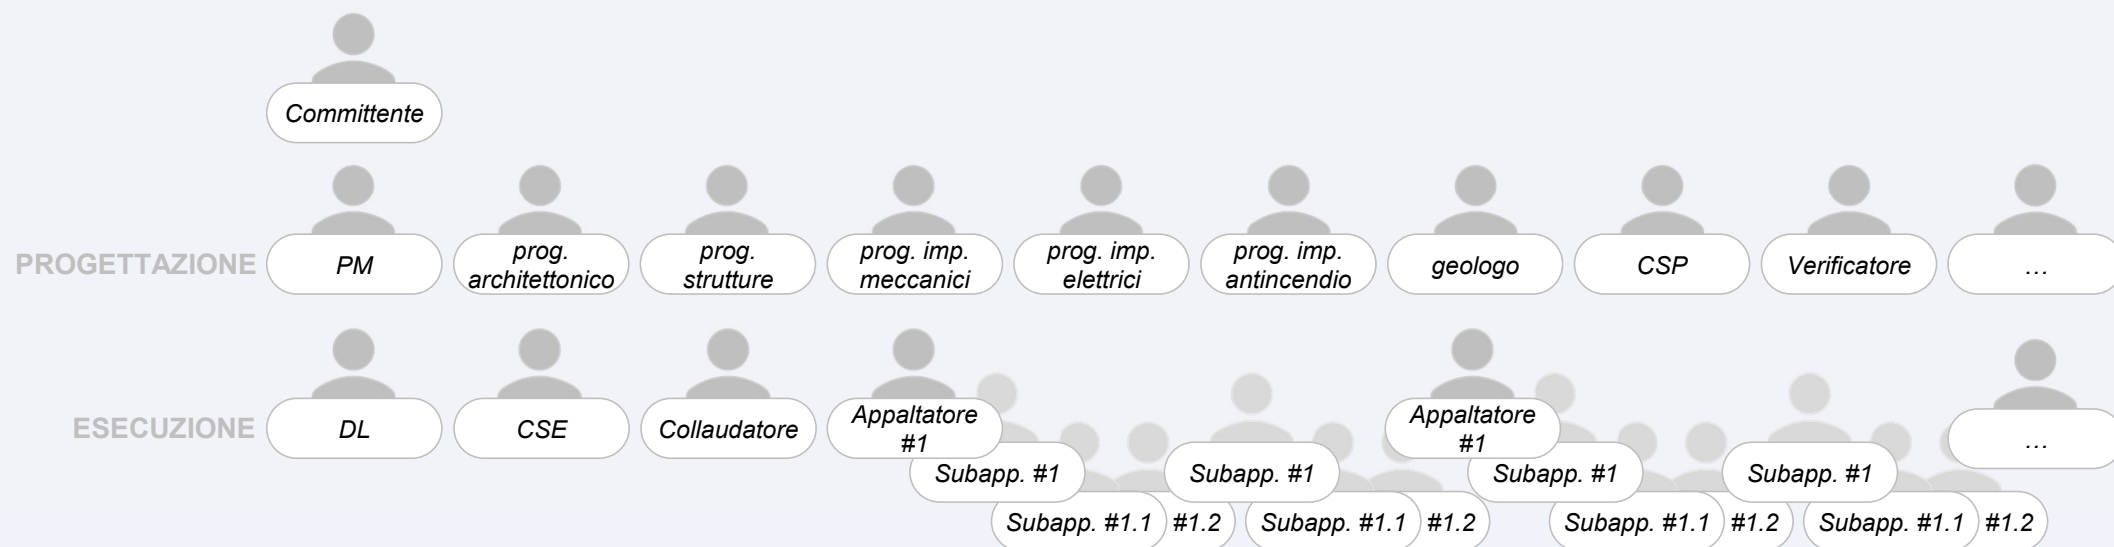


CDE perché è così importante necessario?

ACDat

tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese

> tanti operatori

> tanti operatori **non strutturati**

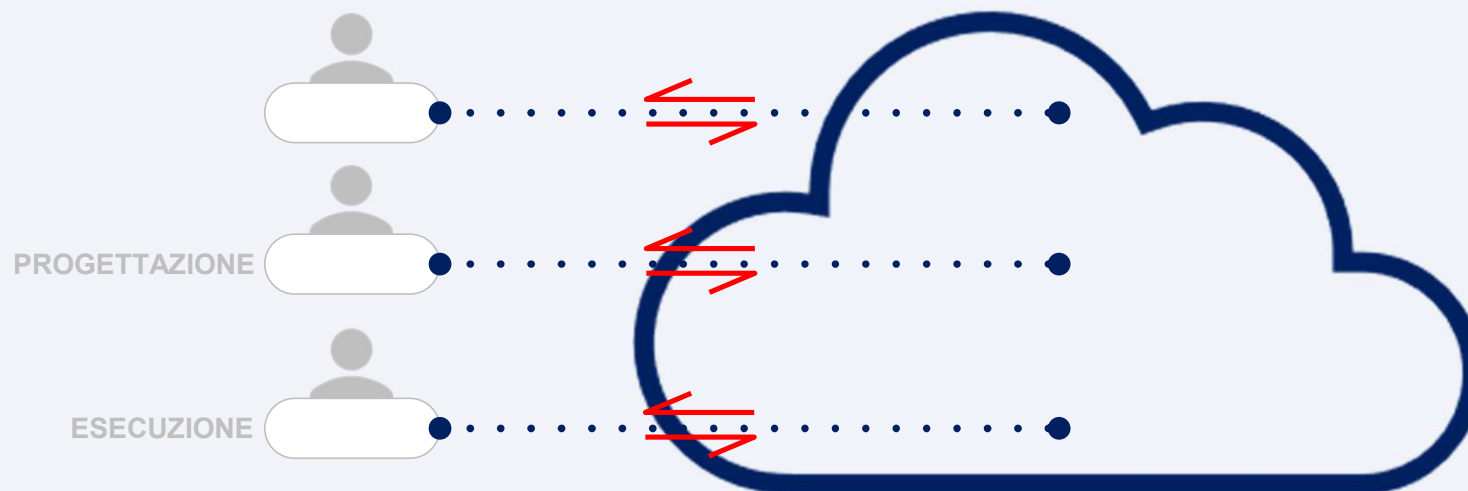

soluzione

TECNOLOGICA

senza che siano necessarie dotazioni hardware e software particolari (bastano: device, connessione e licenza d'uso) si può accedere allo spazio condiviso – attivabile da persone con conoscenze informatiche di base – in cui collaborare con gli altri attori del processo.



soluzione

GESTIONALE

- comunicazione «centralizzata», a beneficio dei futuri soggetti interessati alle informazioni condivise;
- facilità di integrazione nel team di lavoro di fornitori esterni, anche singoli professionisti.

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese

- > tanti operatori
- > tanti operatori **non strutturati**




Contec Ingegneria, in 6 anni ca:

118 commesse

in cui è stato utilizzato l'ACDat

>700 persone

hanno avuto accesso all'ACDat

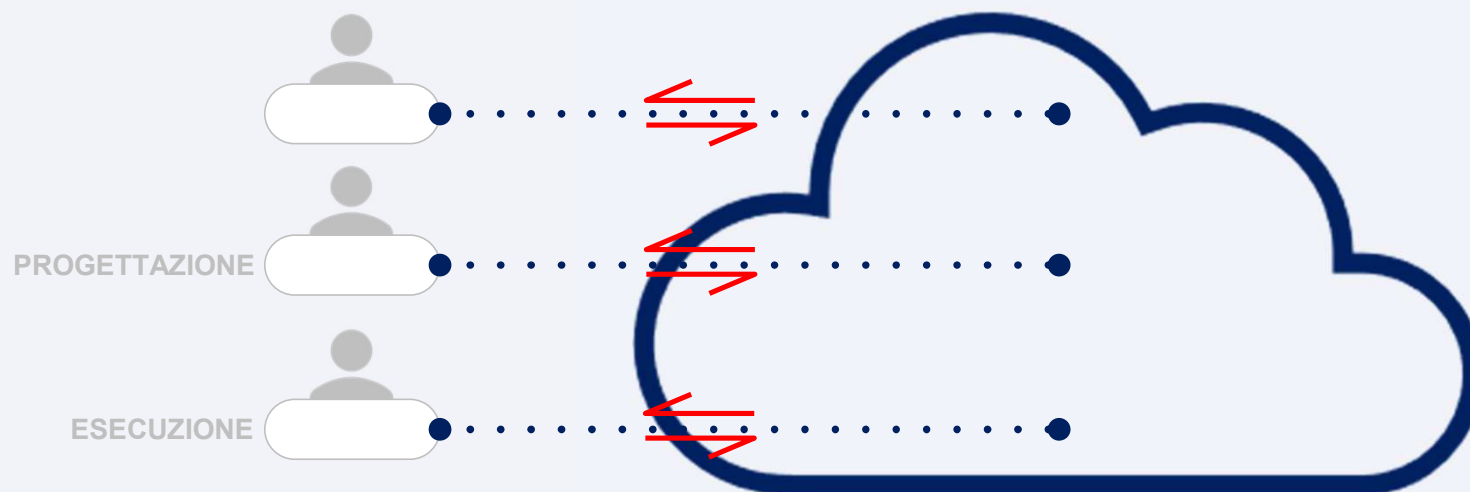

soluzione

TECNOLOGICA

senza che siano necessarie dotazioni hardware e software particolari (bastano: device, connessione e licenza d'uso) si può accedere allo spazio condiviso – attivabile da persone con conoscenze informatiche di base – in cui collaborare con gli altri attori del processo.



soluzione

GESTIONALE

- comunicazione «centralizzata», a beneficio dei futuri soggetti interessati alle informazioni condivise;
- facilità di integrazione nel team di lavoro di fornitori esterni, anche singoli professionisti.

CDE perché è così importante necessario?

ACDat


tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese

> **tanti** operatori

> tanti operatori non strutturati

≈ disabituati ad operare secondo i **principi della qualità**

≈ poveri di conoscenze in materia di **information management**

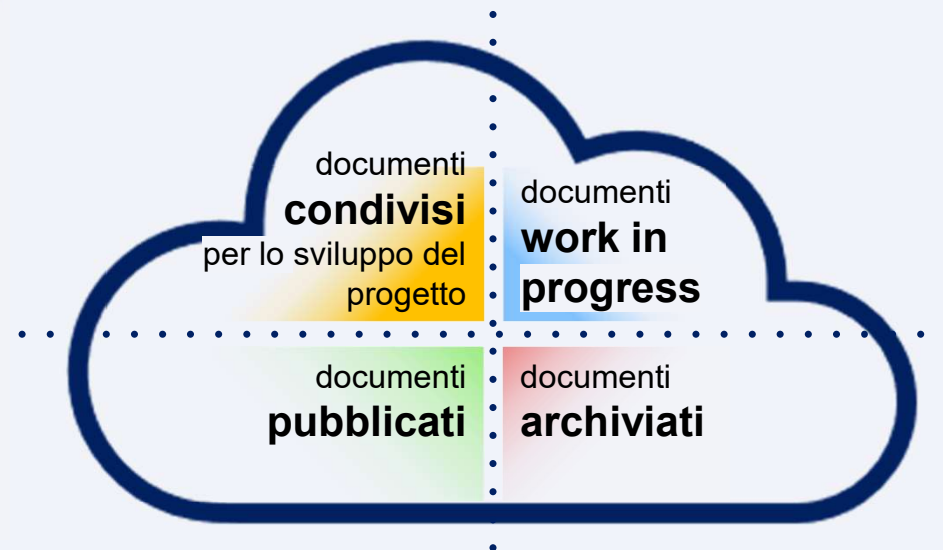

CDE perché è così importante necessario?


ACDat

tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese

> **tanti** operatori

> tanti operatori non strutturati

≈ disabituati ad operare secondo i **principi della qualità**
≈ poveri di conoscenze in materia di **information management**

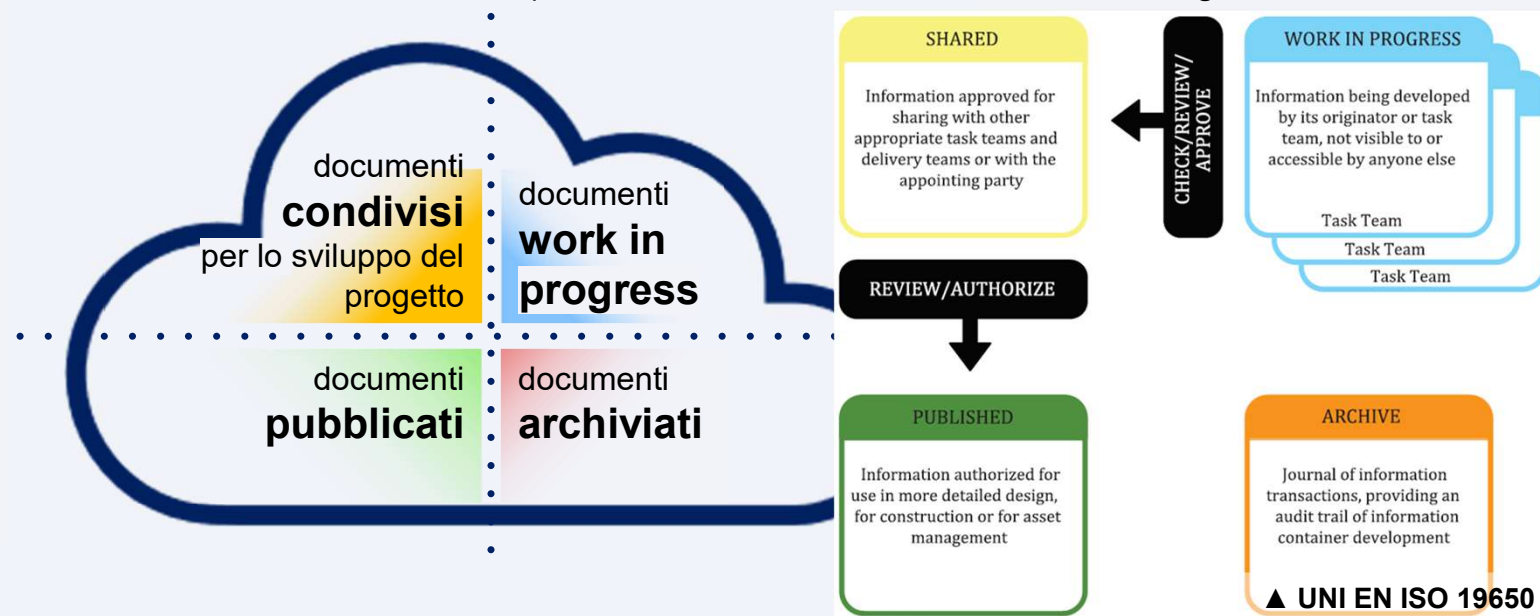

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese

> tanti operatori

> tanti operatori non strutturati

≈ disabituati ad operare secondo i **principi della qualità**

≈ poveri di conoscenze in materia di **information management**



funzioni di
auto-regolamentazione

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese

> tanti operatori

> tanti operatori non strutturati

≈ disabituati ad operare secondo i **principi della qualità**
≈ poveri di conoscenze in materia di **information management**



gestione dei
PERMESSI D'ACCESSO

AUTODESK Construction Cloud

Document Management

26: Permissions - CONTEC

Users: 5 Companies: 5 Roles: 0

Folders Reviews Transmittals

View by

Sets

Plans

Project Files

- L1_CONDIVISO
- L1_CONDIVISO_CLIENTE
 - CONTEC
- L2_PUBBLICATO
- L3_ARCHIVIO

Name	Permission Level	Type	Project Ad...
Edoardo Valentini	Folder Control	User	Project Ad...
Giorgia Fattori	Folder Control	User	Project Ad...
Laura Cunico	Folder Control	User	Project Ad...
Marco Bettio	Folder Control	User	Project Ad...
Michele Carradori (Contec)	Folder Control	User	Project Ad...
Aides Engineering	View+Download	Company	Inherited
Contec AQS S.r.L.	View+Download	Company	Inherited
Contec Ingegneria S.r.L.	View+Download	Company	Inherited
Idea S.r.L.	View+Download	Company	Inherited
Studio Arco	View+Download	Company	Inherited

View+Download

View

- View Only
- View+Download
- Create
- Upload Only
- View+Download+Upload
- Edit
- View+Download+Upload+Edit
- Full Control
- Folder Control

Learn more »

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese

> tanti operatori

> tanti operatori non strutturati

≈ disabituati ad operare secondo i **principi della qualità**
≈ poveri di conoscenze in materia di **information management**



gestione dei
PERMESSI D'ACCESSO

controllo
CODIFICA DOCUMENTI

Apply Default - ISO 19650

Document name preview
XXXXXX-XXX-ZZ-ZZ-AF-A-#####

Document attributes

Naming convention

Project - Originator - Volume/System - Level/Location - Type -

Role - Number

Related attributes

Status - Revision - Classification

Cancel Apply

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO EDILIZIO



produce
oggetti unici



è basato sulla
competitività
piuttosto che sulla
collaborazione



manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'**informazione**



è soggetto a
forti ciclicità



tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese



scarsi investimenti
in **research & development**

→ **ACDat** [CDE] ←

CDE **perché è così importante necessario?**

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

- > **dispersione** delle informazioni
- > scarso **controllo sul processo**



CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

- > **dispersione** delle informazioni
- > scarso **controllo sul processo**

gestione
DOCUMENTALE

gestione documentale
per **cartelle** (tradizionale)
e **metadati** che qualificano
i documenti condivisi

funzioni di
***efficientamento dei
processi informativi***

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni di
**efficientamento dei
processi informativi**

gestione DOCUMENTALE

gestione documentale
per **cartelle** (tradizionale)
e **metadati** che qualificano
i documenti condivisi

Upload files Showing 11 items

Types	File types	Last updated	ActivityBS	Discipline	Type of doc
Search folders or docu...	Select file types	Select dates	Select	Select	Select

☐ Name ^	Description	Type of doc	ActivityBS	Discipline	Version	Set	Last updated
☐ Coil and Charging Shelter	--	--	--	--	--	--	May 20, 2022 9:56 AM
☐ F1 - Facade, roofs and locker room refurbishment	--	--	--	--	--	--	May 23, 2022 8:02 AM
☐ F1 - Seismic Adaptation	--	--	--	--	--	--	May 20, 2022 9:55 AM
☐ Safety	--	--	--	--	--	--	May 20, 2022 9:42 AM
☐ 2479T2011A.pdf	Technical description of the project	Relazioni	F1	ProjectManagement	V1	Tender - 2nd subm...	Sep 30, 2024 3:56 PM
☐ 2479T2901C.pdf	Elenco elaborati / List of documents	Relazioni	F1	ProjectManagement	V1	Tender - 4th subm...	Sep 30, 2024 3:56 PM
☐ 2479T2903-.pdf	Technical standards	SpecificaTecnica	F1	ProjectManagement	V1	Tender - 1st submi...	Sep 30, 2024 3:55 PM
☐ 2479T2904B.pdf	Schema d'offerta / Request for offer	SpecificaTecnica	F1	ProjectManagement	V1	Tender - 4th subm...	Sep 30, 2024 3:56 PM
☐ 2479T2905D.pdf	Bill of quantities - Computo metrico	DocumentiEconomici	F1	ProjectManagement	V1	Tender - 4th subm...	Sep 30, 2024 3:56 PM
☐ 2479T2906B.pdf	Civil works time schedule	Programmazione	F1	ProjectManagement	V1	Tender - 4th subm...	Sep 30, 2024 3:56 PM
☐ 2479T2908A.ppsx	General description of works and phasi...	Relazioni	F1	ProjectManagement	V1	Tender - 4th subm...	Sep 30, 2024 3:56 PM

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

PM
expo
2024

 Istituto Italiano di
Project Management

presenta:
PMexpo
Roma, 4 Ottobre 2024

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione



gestione
DOCUMENTALE

gestione delle
COMUNICAZIONI

comunicazioni **formali**

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni di
efficientamento dei
processi informativi

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification B

Folders Reviews Transmittals Issues

Filter Search by transmittal title, ID

Status	ID	Title	Sent by	Recipients	Created on	Documents
TRANSMITTAL SENT	1005	3252f147fs verbale cessione area alla committenza			Sep 27, 2024 6:16 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1004	2479f326al_WORKS_MinuteOfMeeting-PunchList20240927			Sep 27, 2024 2:42 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1003	240924_sopralluogo fine lavori civili bowl press_Canesi			Sep 24, 2024 11:46 AM	30
TRANSMITTAL SENT	1002	3252f009mi Registro Ingressi 23-09-2024			Sep 23, 2024 7:17 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1001	3252f092 Verifica ITP e POS - CAMERON sub ALUFER			Sep 19, 2024 4:11 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1000	3252f009mh Registro Ingressi 19-09-2024			Sep 19, 2024 10:04 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1009	3252f080c Verifica ITP - ALUFER			Sep 19, 2024 10:02 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1008	3252f080b Verifica ITP e POS - ALUFER			Sep 18, 2024 2:42 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1007	3252f009mg Registro Ingressi 18-09-2024			Sep 18, 2024 7:14 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1006	Verbale di sopralluogo 3252f144fs del 13/09/2024 e allegato fotografico			Sep 17, 2024 10:09 AM	2
TRANSMITTAL SENT	1005	3252f091b Verifica ITP e POS - EFFETI			Sep 16, 2024 7:32 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1004	LA NUOVA EDILPONTEGGI_INTEGRAZIONE			Sep 12, 2024 12:04 PM	10
TRANSMITTAL SENT	1003	LA NUOVA EDILPONTEGGI_aggiornamento documenti			Sep 11, 2024 12:35 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1002	Verbale di sopralluogo 3252f144fs del 06/09/2024 e allegato fotografico			Sep 9, 2024 7:09 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1001	Appalto Italbeton - SAL 3 per lavori eseguiti a tutto il 31/8/2024			Sep 6, 2024 3:59 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1000	2479_PunchList_CBRE			Sep 6, 2024 11:25 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1009	PF COSTRUZIONI Durc_INPS_42346955_03-01-25			Sep 5, 2024 9:34 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1008	CBRE_Dich. Informazione_Formazione_MONTAGGI 24_REV02			Sep 3, 2024 8:40 AM	1

Showing 1 - 20 of 1865

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni di
efficientamento dei
processi informativi

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification B

Folders Reviews Transmittals Issues

Filter Search by transmittal title, ID

Status	ID	Title	Sent by	Recipients	Created on	Documents
TRANSMITTAL SENT	1865	325273476 verbale sessione area alla competenza			Sep 27, 2024 6:16 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1864	34797326al_WORKS_MonsterOfMeeting-PunchList0240527			Sep 27, 2024 2:42 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1863	24030L sopraluogo fine lavori civili boei press_Canai			Sep 24, 2024 11:46 AM	30
TRANSMITTAL SENT	1862	3252100961 Registro Ingressi 23-09-2024			Sep 23, 2024 7:17 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1861	3252100961 Verifica ITP e POS - CAMERON con ALUPER			Sep 19, 2024 4:11 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1860	3252100961 Registro Ingressi 19-09-2024			Sep 19, 2024 10:04 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1859	3252100961 Verifica ITP e POS - ALUPER			Sep 19, 2024 10:02 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1858	3252100961 Verifica ITP e POS - ALUPER			Sep 18, 2024 2:42 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1857	3252100961 Registro Ingressi 18-09-2024			Sep 18, 2024 7:14 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1856	Verbale di sopralluogo 3252100961 del 13/09/2024 e allegato fotografico			Sep 17, 2024 10:09 AM	2
TRANSMITTAL SENT	1855	3252100961 Verifica ITP e POS - EPPE1			Sep 16, 2024 7:32 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1854	LA NUOVA EDILPONTEGGIO INTEGRAZIONE			Sep 12, 2024 12:04 PM	10
TRANSMITTAL SENT	1853	LA NUOVA EDILPONTEGGIO aggiornamento documenti			Sep 11, 2024 12:35 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1852	Verbale di sopralluogo 3252100961 del 06/09/2024 e allegato fotografico			Sep 9, 2024 7:09 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1851	Appalto Itallabaton - SAL 3 per lavori eseguiti a tutto il 31/8/2024			Sep 6, 2024 3:59 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1850	2479_PunchList_CBRE			Sep 6, 2024 11:25 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1849	PF COSTRUZIONE DI DUCI_INPS_42346955_09-01-25			Sep 5, 2024 9:34 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1848	CBRE_Dich. Informazione_Formazione_MONTAGGI 24_REV02			Sep 3, 2024 8:40 AM	1

Showing 1 - 20 of 1865

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni di
efficientamento dei
processi informativi

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification

Folders Reviews Transmittals Issues

Filter Search by transmittal title, ID

Status	ID	Title	Sent by	Recipients	Created on	Documents
TRANSMITTAL SENT	1865	3252f147fs verbale cessione area alla committenza			Sep 27, 2024 6:16 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1864	2479f326al_WORKS_MinuteOfMeeting-PunchList20240927			Sep 27, 2024 2:42 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1863	240924_sopralluogo fine lavori civili bowl press_Canesi			Sep 24, 2024 11:46 AM	30
TRANSMITTAL SENT	1862	3252f009mi Registro Ingressi 23-09-2024			Sep 23, 2024 7:17 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1861	3252f092 Verifica ITP e POS - CAMERON sub ALUFER			Sep 19, 2024 4:11 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1860	3252f009mh Registro Ingressi 19-09-2024			Sep 19, 2024 10:04 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1859	3252f080c Verifica ITP - ALUFER			Sep 19, 2024 10:02 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1858	3252f080b Verifica ITP e POS - ALUFER			Sep 18, 2024 2:42 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1857	3252f009mg Registro Ingressi 18-09-2024			Sep 18, 2024 7:14 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1856	Verbale di sopralluogo 3252f144fs del 13/09/2024 e allegato fotografico			Sep 17, 2024 10:09 AM	2
TRANSMITTAL SENT	1855	3252f091b Verifica ITP e POS - EFFETI			Sep 16, 2024 7:32 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1854	LA NUOVA EDILPONTEGGI_INTEGRAZIONE			Sep 12, 2024 12:04 PM	10
TRANSMITTAL SENT	1853	LA NUOVA EDILPONTEGGI_aggiornamento documenti			Sep 11, 2024 12:35 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1852	Verbale di sopralluogo 3252f144fs del 06/09/2024 e allegato fotografico			Sep 9, 2024 7:09 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1851	Appalto Italbeton - SAL 3 per lavori eseguiti a tutto il 31/8/2024			Sep 6, 2024 3:59 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1850	2479_PunchList_CBRE			Sep 6, 2024 11:25 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1849	PF COSTRUZIONI Durc_INPS_42346955_03-01-25			Sep 5, 2024 9:34 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1848	CBRE_Dich. Informazione_Formazione_MONTAGGI 24_REV02			Sep 3, 2024 8:40 AM	1

Showing 1 - 20 of 1865

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni di
efficientamento dei
processi informativi

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification B

Folders Reviews Transmittals Issues

Filter Search by transmittal title, ID

Status	ID	Title	Sent by	Recipients	Created on	Documents
TRANSMITTAL SENT	1865	3252f147fs verbale cessione area alla committenza			Sep 27, 2024 6:16 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1864	2479f326al_WORKS_MinuteOfMeeting-PunchList20240927			Sep 27, 2024 2:42 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1863	240924_sopralluogo fine lavori civili bowl press_Canesi			Sep 24, 2024 11:46 AM	30
TRANSMITTAL SENT	1862	3252f009mi Registro Ingressi 23-09-2024			Sep 23, 2024 7:17 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1861	3252f092 Verifica ITP e POS - CAMERON sub ALUFER			Sep 19, 2024 4:11 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1860	3252f009mh Registro Ingressi 19-09-2024			Sep 19, 2024 10:04 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1859	3252f080c Verifica ITP - ALUFER			Sep 19, 2024 10:02 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1858	3252f080b Verifica ITP e POS - ALUFER			Sep 18, 2024 2:42 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1857	3252f009mg Registro Ingressi 18-09-2024			Sep 18, 2024 7:14 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1856	Verbale di sopralluogo 3252f144fs del 13/09/2024 e allegato fotografico			Sep 17, 2024 10:09 AM	2
TRANSMITTAL SENT	1855	3252f091b Verifica ITP e POS - EFFETI			Sep 16, 2024 7:32 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1854	LA NUOVA EDILPONTEGGI_INTEGRAZIONE			Sep 12, 2024 12:04 PM	10
TRANSMITTAL SENT	1853	LA NUOVA EDILPONTEGGI_aggiornamento documenti			Sep 11, 2024 12:35 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1852	Verbale di sopralluogo 3252f144fs del 06/09/2024 e allegato fotografico			Sep 9, 2024 7:09 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1851	Appalto Italbeton - SAL 3 per lavori eseguiti a tutto il 31/8/2024			Sep 6, 2024 3:59 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1850	2479_PunchList_CBRE			Sep 6, 2024 11:25 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1849	PF COSTRUZIONI Durc_INPS_42346955_03-01-25			Sep 5, 2024 9:34 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1848	CBRE_Dich. Informazione_Formazione_MONTAGGI 24_REV02			Sep 3, 2024 8:40 AM	1

Showing 1 - 20 of 1865

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni di
efficientamento dei
processi informativi

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification B

Folders Reviews Transmittals Issues

Filter Search by transmittal title, ID

Status	ID	Title	Sent by	Recipients	Created on	Documents
TRANSMITTAL SENT	1865	3252f147fs verbale cessione area alla committenza			Sep 27, 2024 8:26 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1864	2479f326al_WORKS_MinuteOfMeeting-PunchList20240927			Sep 27, 2024 2:42 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1863	240924_sopralluogo fine lavori civili bowl press_Canesi			Sep 26, 2024 11:44 AM	30
TRANSMITTAL SENT	1862	3252f009mi Registro Ingressi 23-09-2024			Sep 23, 2024 7:17 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1861	3252f092 Verifica ITP e POS - CAMERON sub ALUFER			Sep 19, 2024 4:31 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1860	3252f009mh Registro Ingressi 19-09-2024			Sep 19, 2024 10:04 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1859	3252f080c Verifica ITP - ALUFER			Sep 18, 2024 10:02 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1858	3252f080b Verifica ITP e POS - ALUFER			Sep 18, 2024 2:42 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1857	3252f009mg Registro Ingressi 18-09-2024			Sep 18, 2024 7:03 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1856	Verbale di sopralluogo 3252f144fs del 13/09/2024 e allegato fotografico			Sep 12, 2024 10:09 AM	2
TRANSMITTAL SENT	1855	3252f091b Verifica ITP e POS - EFFETI			Sep 10, 2024 7:32 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1854	LA NUOVA EDILPONTEGGI_INTEGRAZIONE			Sep 12, 2024 12:04 PM	10
TRANSMITTAL SENT	1853	LA NUOVA EDILPONTEGGI_aggiornamento documenti			Sep 11, 2024 12:39 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1852	Verbale di sopralluogo 3252f144fs del 06/09/2024 e allegato fotografico			Sep 9, 2024 7:09 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1851	Appalto Italbeton - SAL 3 per lavori eseguiti a tutto il 31/8/2024			Sep 6, 2024 3:59 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1850	2479_PunchList_CBRE			Sep 6, 2024 11:25 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1849	PF COSTRUZIONI Durc_INPS_42346955_03-01-25			Sep 5, 2024 9:34 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1848	CBRE_Dich. Informazione_Formazione_MONTAGGI 24_REV02			Sep 3, 2024 8:40 AM	1

Showing 1 - 20 of 1865

P/M
expo
2024

Istituto Italiano di
Project Management

presenta:
PMexpo
Roma, 4 Ottobre 2024

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni di
efficientamento dei
processi informativi

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification B

Folders Reviews Transmittals Issues

Filter Search by transmittal title, ID

Status	ID	Title	Sent by	Recipients	Created on	Documents
TRANSMITTAL SENT	1865	3252f147fs verbale cessione area alla committenza			Sep 27, 2024 6:16 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1864	2479f326al_WORKS_MinuteOfMeeting-PunchList20240927			Sep 27, 2024 2:42 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1863	240924_sopralluogo fine lavori civili bowl press_Canesi			Sep 24, 2024 11:46 AM	10
TRANSMITTAL SENT	1862	3252f009mi Registro Ingressi 23-09-2024			Sep 23, 2024 7:17 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1861	3252f092 Verifica ITP e POS - CAMERON sub ALUFER			Sep 19, 2024 4:11 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1860	3252f009mh Registro Ingressi 19-09-2024			Sep 19, 2024 10:04 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1859	3252f080c Verifica ITP - ALUFER			Sep 19, 2024 10:02 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1858	3252f080b Verifica ITP e POS - ALUFER			Sep 18, 2024 2:42 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1857	3252f009mg Registro Ingressi 18-09-2024			Sep 18, 2024 7:14 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1856	Verbale di sopralluogo 3252f144fs del 13/09/2024 e allegato fotografico			Sep 17, 2024 10:09 AM	2
TRANSMITTAL SENT	1855	3252f091b Verifica ITP e POS - EFFETI			Sep 16, 2024 7:32 PM	1
TRANSMITTAL SENT	1854	LA NUOVA EDILPONTEGGI_INTEGRAZIONE			Sep 12, 2024 12:04 PM	10
TRANSMITTAL SENT	1853	LA NUOVA EDILPONTEGGI_aggiornamento documenti			Sep 11, 2024 12:35 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1852	Verbale di sopralluogo 3252f144fs del 06/09/2024 e allegato fotografico			Sep 9, 2024 7:09 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1851	Appalto Italbeton - SAL 3 per lavori eseguiti a tutto il 31/8/2024			Sep 6, 2024 3:59 PM	2
TRANSMITTAL SENT	1850	2479_PunchList_CBRE			Sep 6, 2024 11:25 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1849	PF COSTRUZIONI Durc_INPS_42346955_03-01-25			Sep 5, 2024 9:34 AM	1
TRANSMITTAL SENT	1848	CBRE_Dich. Informazione_Formazione_MONTAGGI 24_REV02			Sep 3, 2024 8:40 AM	1

Showing 1 - 20 of 1865

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione



gestione
DOCUMENTALE

gestione delle
COMUNICAZIONI

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione


funzioni di
**efficientamento dei
processi informativi**

gestione
DOCUMENTALE

gestione delle
COMUNICAZIONI

comunicazioni **formali**
comunicazioni **informali**

~~download + e-mail + allegati~~
~~download + WeTransfer~~

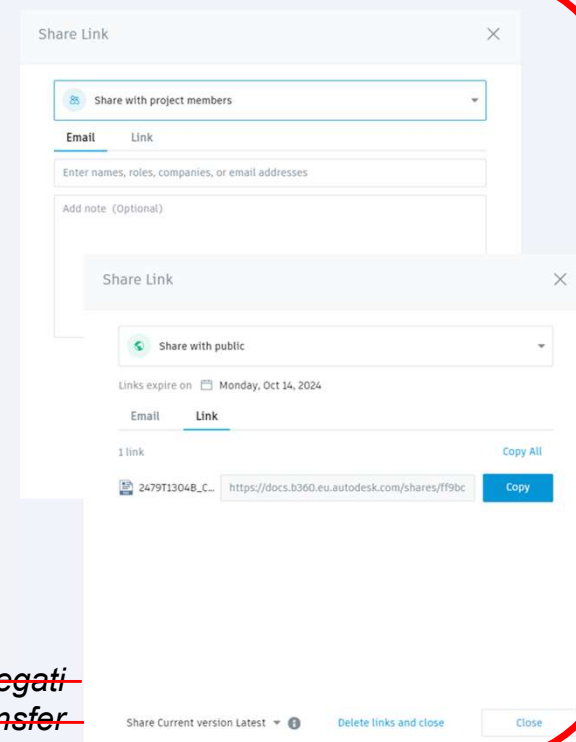

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione



gestione
DOCUMENTALE

gestione delle
COMUNICAZIONI

comunicazioni **formali**
comunicazioni **informali**
note di **revisione/segnalazione**


CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

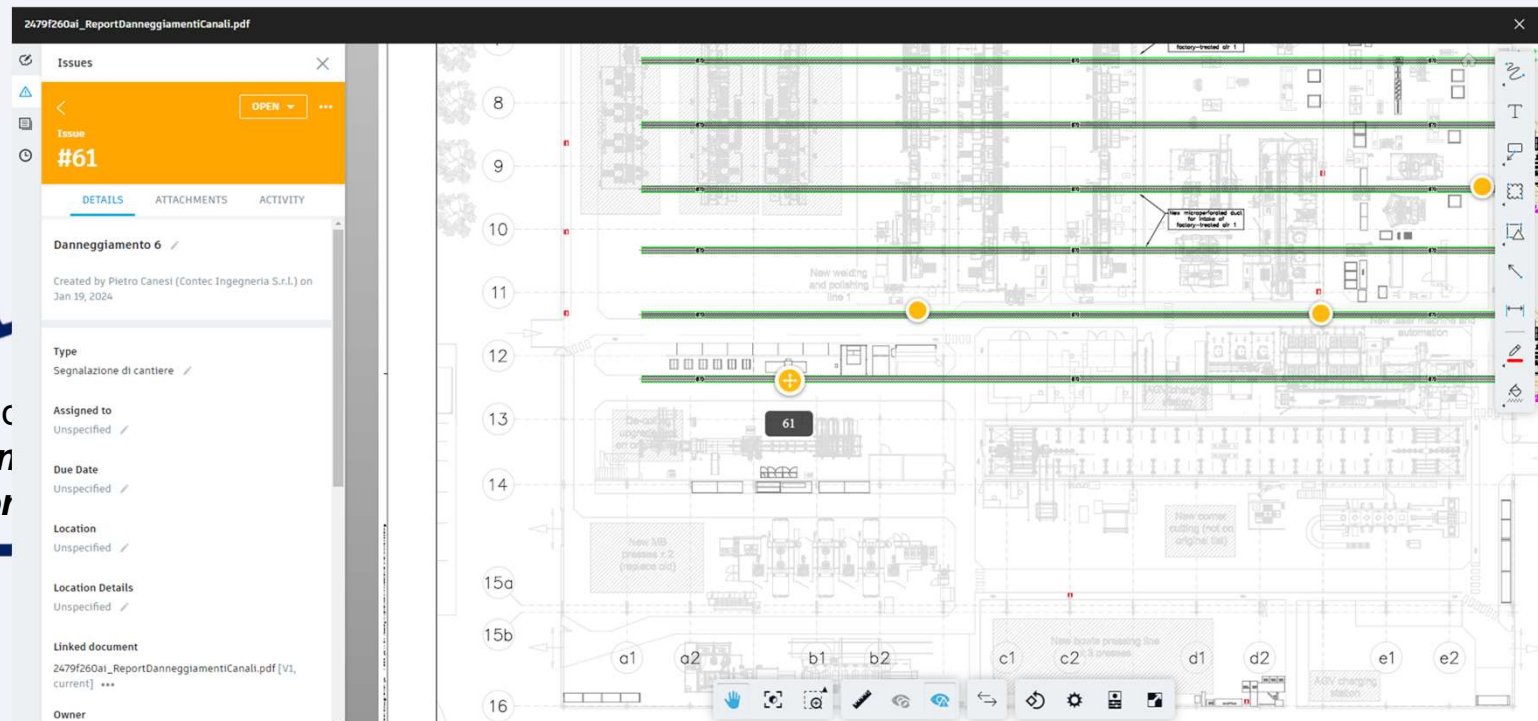


CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

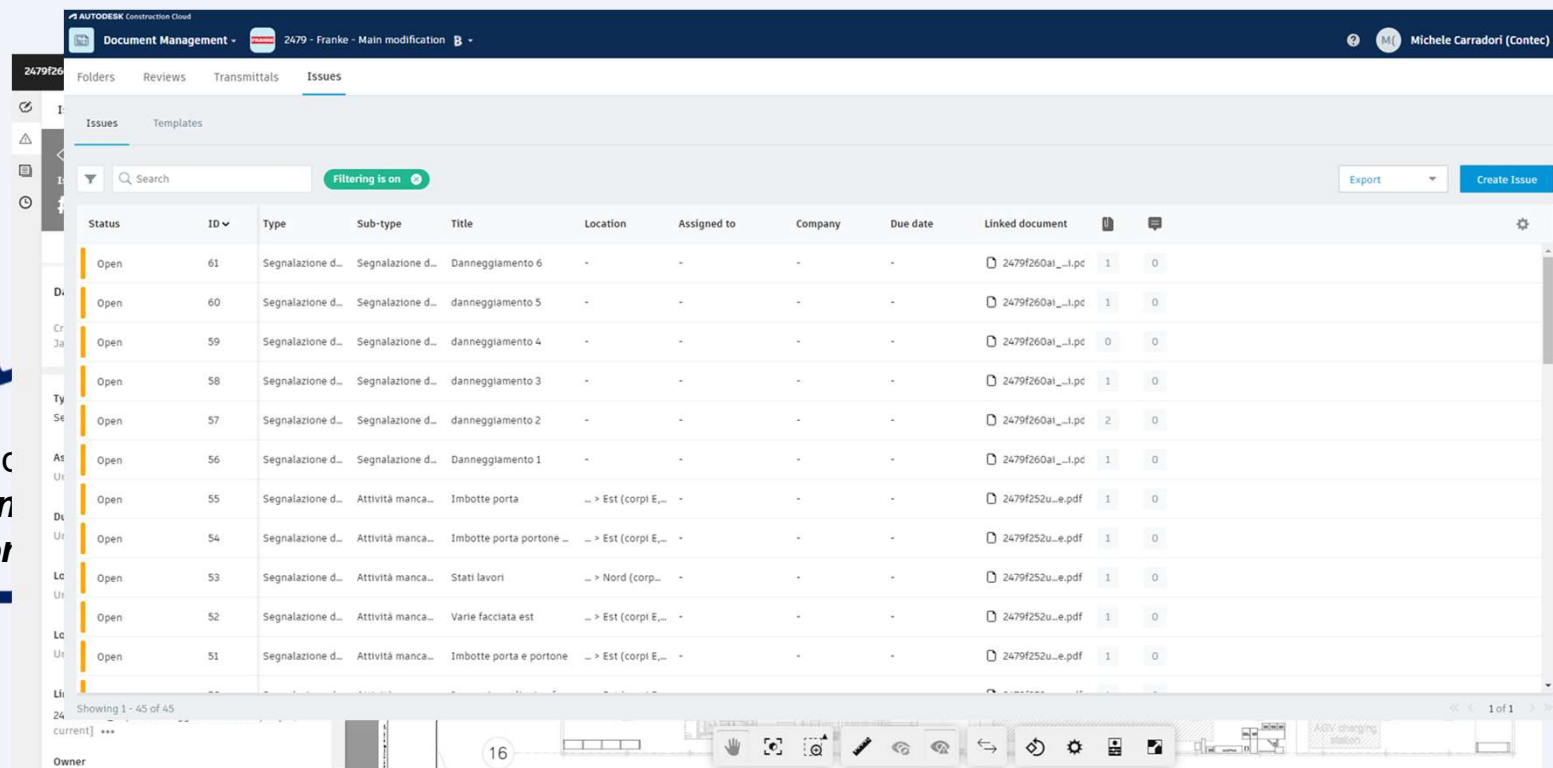

Status	ID	Type	Sub-type	Title	Location	Assigned to	Company	Due date	Linked document		
Open	61	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 6	-	-	-	-	2479f260ai_1.pc	1	0
Open	60	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 5	-	-	-	-	2479f260ai_1.pc	1	0
Open	59	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 4	-	-	-	-	2479f260ai_1.pc	0	0
Open	58	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 3	-	-	-	-	2479f260ai_1.pc	1	0
Open	57	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 2	-	-	-	-	2479f260ai_1.pc	2	0
Open	56	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 1	-	-	-	-	2479f260ai_1.pc	1	0
Open	55	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta	... > Est (corpi E...	-	-	-	2479f252u_e.pdf	1	0
Open	54	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta portone	... > Est (corpi E...	-	-	-	2479f252u_e.pdf	1	0
Open	53	Segnalazione d...	Attività manca...	Stati lavori	... > Nord (corp...	-	-	-	2479f252u_e.pdf	1	0
Open	52	Segnalazione d...	Attività manca...	Varie facciata est	... > Est (corpi E...	-	-	-	2479f252u_e.pdf	1	0
Open	51	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta e portone	... > Est (corpi E...	-	-	-	2479f252u_e.pdf	1	0

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

The screenshot displays the Autodesk Construction Cloud (ACC) interface. The main view is the 'Issues' tab, showing a list of issues with columns for Status, ID, Type, Sub-type, Title, Location, Assigned to, Company, and Due date. The list shows several 'Open' issues related to 'Segnalazione d...' and 'danneggiamento'. A detailed view of issue #61 is shown on the right, including fields for Assigned to, Due Date, Location, Location Details, Linked document, Description, Response, and Photos. A dropdown menu is visible over the 'Open' status, showing options: Open, Answered, Closed, Approve issue and close, and Void.

Status	ID	Type	Sub-type	Title	Location	Assigned to	Company	Due date
Open	61	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 6				
Open	60	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 5	-	-	-	-
Open	59	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 4	-	-	-	-
Open	58	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 3	-	-	-	-
Open	57	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 2	-	-	-	-
Open	56	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 1	-	-	-	-
Open	55	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta	... > Est (corpi E...	-	-	-
Open	54	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta portone	... > Est (corpi E...	-	-	-
Open	53	Segnalazione d...	Attività manca...	Stati lavori	... > Nord (corp...	-	-	-
Open	52	Segnalazione d...	Attività manca...	Varie facciata est	... > Est (corpi E...	-	-	-
Open	51	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta e portone	... > Est (corpi E...	-	-	-

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

The screenshot displays the Autodesk Construction Cloud (ACC) interface. The main view is the 'Issues' tab, showing a list of issues with columns for Status, ID, Type, Sub-type, Title, Location, Assigned to, Company, and Due date. The list shows several 'Open' issues related to 'Segnalazione d...' and 'danneggiamento'. A detailed view of issue #61 is shown on the right, including fields for 'Assigned to', 'Due Date', 'Location', 'Location Details', 'Linked document', 'Description', 'Response', and 'Photos'. A dropdown menu is visible in the top right corner of the issue details panel, showing options: 'Open', 'Answered', 'Closed', 'Approve issue and close', and 'Void'.

Status	ID	Type	Sub-type	Title	Location	Assigned to	Company	Due date
Open	61	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 6				
Open	60	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 5				
Open	59	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 4				
Open	58	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 3				
Open	57	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 2				
Open	56	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 1				
Open	55	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta	... > Est (corpi E...			
Open	54	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta portone	... > Est (corpi E...			
Open	53	Segnalazione d...	Attività manca...	Stati lavori	... > Nord (corp...			
Open	52	Segnalazione d...	Attività manca...	Varie facciata est	... > Est (corpi E...			
Open	51	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta e portone	... > Est (corpi E...			

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

The screenshot displays the Autodesk Construction Cloud (ACC) interface. The main view is the 'Issues' tab, showing a list of issues with columns for Status, ID, Type, Sub-type, Title, Location, Assigned to, Company, and Due date. The list shows several 'Open' issues related to 'Segnalazione d...' and 'danneggiamento'. A detailed view of issue #61 is shown on the right, including fields for Assigned to, Due Date, Location, Location Details, Linked document, Description, Response, and Photos. A dropdown menu is visible in the top right corner of the issue details panel, showing options: Open, Answered, Closed, Approve issue and close, and Void.

Status	ID	Type	Sub-type	Title	Location	Assigned to	Company	Due date
Open	61	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 6				
Open	60	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 5				
Open	59	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 4				
Open	58	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 3				
Open	57	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 2				
Open	56	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 1				
Open	55	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta	... > Est (corpi E...			
Open	54	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta portone	... > Est (corpi E...			
Open	53	Segnalazione d...	Attività manca...	Stati lavori	... > Nord (corp...			
Open	52	Segnalazione d...	Attività manca...	Varie facciata est	... > Est (corpi E...			
Open	51	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta e portone	... > Est (corpi E...			

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

The screenshot displays the Autodesk Construction Cloud (ACC) interface. The main view is the 'Issues' tab, showing a list of issues with columns for Status, ID, Type, Sub-type, Title, Location, Assigned to, Company, and Due date. The list shows several 'Open' issues related to 'Segnalazione d...' and 'danneggiamento'. A detailed view of issue #61 is shown on the right, including fields for Assigned to, Due Date, Location, Location Details, Linked document, Description, Response, and Photos. A dropdown menu is visible in the top right corner of the issue details panel, showing options: Open, Answered, Closed, Approve issue and close, and Void.

Status	ID	Type	Sub-type	Title	Location	Assigned to	Company	Due date
Open	61	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 6				
Open	60	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 5				
Open	59	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 4				
Open	58	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 3				
Open	57	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 2				
Open	56	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 1				
Open	55	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta	... > Est (corpi E...			
Open	54	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta portone	... > Est (corpi E...			
Open	53	Segnalazione d...	Attività manca...	Stati lavori	... > Nord (corp...			
Open	52	Segnalazione d...	Attività manca...	Varie facciata est	... > Est (corpi E...			
Open	51	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta e portone	... > Est (corpi E...			

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

The screenshot displays the Autodesk Construction Cloud (ACC) interface. The main panel shows a list of issues under the 'Issues' tab. The table has columns for Status, ID, Type, Sub-type, Title, Location, Assigned to, Company, and Due date. The first issue, ID 61, is 'Open' and titled 'Danneggiamento 6'. To the right, a detailed view of issue #61 is shown, including fields for Assigned to, Due Date, Location, Location Details, Linked document, Description, Response, and Photos. A dropdown menu is open over the 'Open' status, showing options: Open, Answered, Closed, Approve issue and close, and Void.

Status	ID	Type	Sub-type	Title	Location	Assigned to	Company	Due date
Open	61	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 6				
Open	60	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 5				
Open	59	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 4				
Open	58	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 3				
Open	57	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 2				
Open	56	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 1				
Open	55	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta	... > Est (corpi E...			
Open	54	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta portone	... > Est (corpi E...			
Open	53	Segnalazione d...	Attività manca...	Stati lavori	... > Nord (corp...			
Open	52	Segnalazione d...	Attività manca...	Varie facciata est	... > Est (corpi E...			
Open	51	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta e portone	... > Est (corpi E...			

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

The screenshot displays the Autodesk Construction Cloud (ACC) interface. The main view is the 'Issues' tab, showing a list of issues with columns for Status, ID, Type, Sub-type, Title, Location, Assigned to, Company, and Due date. The list shows several 'Open' issues related to 'Segnalazione d...' and 'danneggiamento'. A detailed view of issue #61 is shown on the right, including fields for Assigned to, Due Date, Location, Location Details, Type, Owner, Root Cause, and a linked document. A dropdown menu is visible in the top right corner of the issue details panel, showing options: Open, Answered, Closed, Approve issue and close, and Void.

Status	ID	Type	Sub-type	Title	Location	Assigned to	Company	Due date
Open	61	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 6				
Open	60	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 5				
Open	59	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 4				
Open	58	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 3				
Open	57	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 2				
Open	56	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 1				
Open	55	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta	... > Est (corpi E...			
Open	54	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta portone	... > Est (corpi E...			
Open	53	Segnalazione d...	Attività manca...	Stati lavori	... > Nord (corp...			
Open	52	Segnalazione d...	Attività manca...	Varie facciata est	... > Est (corpi E...			
Open	51	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta e portone	... > Est (corpi E...			

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

The screenshot displays the Autodesk Construction Cloud (ACC) interface. The main panel shows a list of issues under the 'Issues' tab. The table includes columns for Status, ID, Type, Sub-type, Title, Location, Assigned to, Company, and Due date. A filter is applied: 'Filtering is on'. The list shows several 'Open' issues related to 'Segnalazione d...' and 'danneggiamento'. A detailed view of issue #61 is shown on the right, including fields for Assigned to, Due Date, Location, Location Details, Type, Owner, Root Cause, and a linked document '2479f260ai_ReportDanneggiamentiCanali.pdf [V1, current]'. A dropdown menu is open over the 'Open' status, showing options: Open, Answered, Closed, Approve issue and close, and Void.

Status	ID	Type	Sub-type	Title	Location	Assigned to	Company	Due date
Open	61	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 6				
Open	60	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 5				
Open	59	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 4				
Open	58	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 3				
Open	57	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 2				
Open	56	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 1				
Open	55	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta	... > Est (corpi E...			
Open	54	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta portone	... > Est (corpi E...			
Open	53	Segnalazione d...	Attività manca...	Stati lavori	... > Nord (corp...			
Open	52	Segnalazione d...	Attività manca...	Varie facciata est	... > Est (corpi E...			
Open	51	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta e portone	... > Est (corpi E...			

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

The screenshot displays the Autodesk Construction Cloud (ACC) interface. The main view is the 'Issues' tab, showing a list of issues with columns for Status, ID, Type, Sub-type, Title, Location, Assigned to, Company, and Due date. The list shows several 'Open' issues related to 'Segnalazione d...' and 'danneggiamento'. A detailed view of issue #61 is shown on the right, including fields for Assigned to, Due Date, Location, Location Details, Linked document, Description, Response, and Photos. A dropdown menu is visible in the top right corner of the issue details panel, showing options: Open, Answered, Closed, Approve issue and close, and Void.

Status	ID	Type	Sub-type	Title	Location	Assigned to	Company	Due date
Open	61	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 6				
Open	60	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 5				
Open	59	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 4				
Open	58	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 3				
Open	57	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 2				
Open	56	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 1				
Open	55	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta	... > Est (corpi E...			
Open	54	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta portone	... > Est (corpi E...			
Open	53	Segnalazione d...	Attività manca...	Stati lavori	... > Nord (corp...			
Open	52	Segnalazione d...	Attività manca...	Varie facciata est	... > Est (corpi E...			
Open	51	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta e portone	... > Est (corpi E...			

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni c
efficientamen
processi infor

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

The screenshot displays the Autodesk Construction Cloud (ACC) interface. The main panel shows a list of issues under the 'Issues' tab. The table includes columns for Status, ID, Type, Sub-type, Title, Location, Assigned to, Company, and Due date. A filter is applied: 'Filtering is on'. The right panel shows the details for Issue #61, 'Danneggiamento 6', created by Pietro Canesi on Jan 19, 2024. It includes fields for Assigned to, Due Date, Location, Location Details, Type, Owner, and Root Cause. A linked document '2479f260ai_ReportDanneggiamentiCanali.pdf [V1, current]' is shown. The bottom of the interface shows a navigation bar with a page number '16' and various tool icons.

Status	ID	Type	Sub-type	Title	Location	Assigned to	Company	Due date
Open	61	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 6				
Open	60	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 5	-	-	-	-
Open	59	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 4	-	-	-	-
Open	58	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 3	-	-	-	-
Open	57	Segnalazione d...	Segnalazione d...	danneggiamento 2	-	-	-	-
Open	56	Segnalazione d...	Segnalazione d...	Danneggiamento 1	-	-	-	-
Open	55	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta	... > Est (corpi E...	-	-	-
Open	54	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta portone	... > Est (corpi E...	-	-	-
Open	53	Segnalazione d...	Attività manca...	Stati lavori	... > Nord (corp...	-	-	-
Open	52	Segnalazione d...	Attività manca...	Varie facciata est	... > Est (corpi E...	-	-	-
Open	51	Segnalazione d...	Attività manca...	Imbotte porta e portone	... > Est (corpi E...	-	-	-

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

funzioni di
efficientamento dei
processi informativi

gestione
DOCUMENTALE

gestione delle
COMUNICAZIONI

gestione dei
FLUSSI APPROVATI

screenshot dalla piattaforma
Autodesk Construction Cloud

General info

Name *

Richiesta di approvazione a 2 step - PROVA

Description

Create

Steps

Select an

Initiator *

Select a user, role, or company

More options >

Step name

Initial Review

Reviewer Type *

Single Reviewer

Reviewers *

Select a user, role, or company

More options >

Time allowed *

3

Calendar days

Step name

Final Review

Approver *

Select a user, role, or company

More options >

Time allowed *

3

Calendar days

File review status

Value *

Approved

Rejected

Approved

Add status

Review status label *

Approved

Rejected

Approved w/ comments

f(utente)

f(ruolo)

f(organizzazione)

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca
sistema in
di gesti
dell'inform

efficace
processo

AUTODESK Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification

Michele Carradori (Contec)

Filters: Reviews, Transmittals, Issues

Reviews Archived reviews

Filter Search by review name, ID

Export (533) filtered

You are viewing reviews with filters/search applied. [Clear all](#)

	Status	ID	Review name	Workflow	Initiated by	Next action by	Next action due	Created on	Finished on	Documents	Approved	Rejected	Progress	
☐	CLOSED	828	Invio schede tecniche trattamento antioilo	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	--	--	--	Sep 24, 2024 12:46 PM	Sep 26, 2024 6:02 PM	2	2	0		
☐	CLOSED	827	INSEGNE REV.1	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Sep 23, 2024 10:50 AM	Sep 30, 2024 11:37 AM	2	2	0		
☐	OPEN	803	Variante lattonerie impianti lato OVEST	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--		
☐	OPEN	802	Variante maggior peso scale	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--		
☐	CLOSED	800	Emissione versione 0 Progetto costruttivo carpen...	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jul 26, 2024 5:30 PM	Jul 29, 2024 6:07 PM	6	6	0		
☐	OPEN	799	CERTIFICAZIONE DOP-CE PORTE US	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 5, 2024	Jul 26, 2024 8:37 AM	--	--	5	--	--		
☐	OPEN	798	VAR 62 - elettrificazione porte	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 4, 2024	Jul 25, 2024 10:32 AM	--	--	1	--	--		
☐	OPEN	796	Variante braccetti chiudiporta	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 3, 2024	Jul 24, 2024 2:45 PM	--	--	1	--	--		
☐	CLOSED	775	Progetto vasca bianca - Rev.01	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jun 20, 2024 3:42 PM	Jun 28, 2024 11:27 AM	1	1	0		
☐	CLOSED	774	Attività pavimentazione tettoia fumatori est	Richiesta approvazione variante - Opere edili	--	--	--	Jun 18, 2024 8:33 AM	Jun 20, 2024 4:34 PM	1	1	0		
☐	OPEN	773	lattonerie porte e portoni	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	Pietro Canesi	Jun 22, 2024	Jun 12, 2024 3:30 PM	--	--	2	--	--		

Showing 1 - 20 of 533

1 of 27

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca
sistema in
di gesti
dell'inform

efficace
processo

AUTODESK Construction Cloud

Document Management 2479 - Franke - Main modification B

Michele Carradori (Contec)

Filters Reviews Transmittals Issues

Reviews Archived reviews

Filter Search by review name, ID Export (533) filtered

You are viewing reviews with filters/search applied. Clear all

	Status	ID	Review name	Workflow	Initiated by	Next action by	Next action due	Created on	Finished on	Documents	Approved	Rejected	Progress
☐	CLOSED	828	Invio schede tecniche trattamento antioilo	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	--	--	--	Sep 24, 2024 12:46 PM	Sep 26, 2024 6:02 PM	2	2	0	
☐	CLOSED	827	INSEGNE REV.1	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Sep 23, 2024 10:50 AM	Sep 30, 2024 11:37 AM	2	2	0	
☐	OPEN	803	Variente lattonerie impianti lato OVEST	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--	
☐	OPEN	802	Variente maggior peso scale	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--	
☐	CLOSED	800	Emissione versione 0 Progetto costruttivo carpen...	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jul 26, 2024 5:30 PM	Jul 29, 2024 6:07 PM	6	6	0	
☐	OPEN	799	CERTIFICAZIONE DOP-CE PORTE US	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 5, 2024	Jul 26, 2024 8:37 AM	--	--	5	--	--	
☐	OPEN	798	VAR 62 - elettrificazione porte	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 4, 2024	Jul 25, 2024 10:32 AM	--	--	1	--	--	
☐	OPEN	796	Variente braccetti chiudiporta	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 3, 2024	Jul 24, 2024 2:45 PM	--	--	1	--	--	
☐	CLOSED	775	Progetto vasca bianca - Rev.01	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jun 20, 2024 3:42 PM	Jun 28, 2024 11:27 AM	1	1	0	
☐	CLOSED	774	Attività pavimentazione tettoia fumatori est	Richiesta approvazione variante - Opere edili	--	--	--	Jun 18, 2024 8:33 AM	Jun 20, 2024 4:34 PM	1	1	0	
☐	OPEN	773	lattonerie porte e portoni	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	Pietro Canesi	Jun 22, 2024	Jun 12, 2024 3:30 PM	--	--	2	--	--	

Showing 1 - 20 of 533

1 of 27

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca
sistema in
di gesti
dell'inform

efficace
processo

AUTODESK Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification

Michele Carradori (Contec)

Reviews

Search by review name, ID

Export (533) filtered

You are viewing reviews with filters/search applied. [Clear all](#)

	Status	ID	Review name	Workflow	Initiated by	Next action by	Next action due	Created on	Finished on	Documents	Approved	Rejected	Progress
☐	CLOSED	828	Invio schede tecniche trattamento antioilo	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	--	--	--	Sep 24, 2024 12:46 PM	Sep 26, 2024 6:02 PM	2	2	0	
☐	CLOSED	827	INSEGNE REV.1	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Sep 23, 2024 10:50 AM	Sep 30, 2024 11:37 AM	2	2	0	
☐	OPEN	803	Variante lattonerie impianti lato OVEST	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--	
☐	OPEN	802	Variante maggior peso scale	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--	
☐	CLOSED	800	Emissione versione 0 Progetto costruttivo carpen...	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jul 26, 2024 5:30 PM	Jul 29, 2024 6:07 PM	6	6	0	
☐	OPEN	799	CERTIFICAZIONE DOP-CE PORTE US	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 5, 2024	Jul 26, 2024 8:37 AM	--	--	5	--	--	
☐	OPEN	798	VAR 62 - elettrificazione porte	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 4, 2024	Jul 25, 2024 10:32 AM	--	--	1	--	--	
☐	OPEN	796	Variante braccetti chiudiporta	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 3, 2024	Jul 24, 2024 2:45 PM	--	--	1	--	--	
☐	CLOSED	775	Progetto vasca bianca - Rev.01	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jun 20, 2024 3:42 PM	Jun 28, 2024 11:27 AM	1	1	0	
☐	CLOSED	774	Attività pavimentazione tettoia fumatori est	Richiesta approvazione variante - Opere edili	--	--	--	Jun 18, 2024 8:33 AM	Jun 20, 2024 4:34 PM	1	1	0	
☐	OPEN	773	lattonerie porte e portoni	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	Pietro Canesi	Jun 22, 2024	Jun 12, 2024 3:30 PM	--	--	2	--	--	

Showing 1 - 20 of 533

1 of 27

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca
sistema in
di gesti
dell'inform

efficace
processo

AUTODESK Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification

Michele Carradori (Contec)

Reviews

Filter Search by review name, ID

You are viewing reviews with filters/search applied. Clear all

Status	ID	Review name	Workflow	Initiated by	Next action by	Next action due	Created on	Finished on	Documents	Approved	Rejected	Progress
CLOSED	828	Invio schede tecniche trattamento antioilo	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili				Sep 24, 2024 12:46 PM	Sep 26, 2024 6:02 PM	2	2	0	
CLOSED	827	INSEGNE REV.1	Richiesta approvazione tecnica - Strutture				Sep 23, 2024 10:50 AM	Sep 30, 2024 11:37 AM	2	2	0	
OPEN	803	Variante lattonerie impianti lato OVEST	Richiesta approvazione variante - Opere edili		DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	1	--	--	
OPEN	802	Variante maggior peso scale	Richiesta approvazione variante - Opere edili		DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	1	--	--	
CLOSED	800	Emissione versione 0 Progetto costruttivo carpen...	Richiesta approvazione tecnica - Strutture				Jul 26, 2024 5:30 PM	Jul 29, 2024 6:07 PM	6	6	0	
OPEN	799	CERTIFICAZIONE DOP-CE PORTE US	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili		DL - Opere Edili...	Aug 5, 2024	Jul 26, 2024 8:37 AM	--	5	--	--	
OPEN	798	VAR 62 - elettrificazione porte	Richiesta approvazione variante - Opere edili		DL - Opere Edili...	Aug 4, 2024	Jul 25, 2024 10:32 AM	--	1	--	--	
OPEN	796	Variante braccetti chiudiporta	Richiesta approvazione variante - Opere edili		DL - Opere Edili...	Aug 3, 2024	Jul 24, 2024 2:45 PM	--	1	--	--	
CLOSED	775	Progetto vasca bianca - Rev.01	Richiesta approvazione tecnica - Strutture				Jun 20, 2024 3:42 PM	Jun 28, 2024 11:27 AM	1	1	0	
CLOSED	774	Attività pavimentazione tettoia fumatori est	Richiesta approvazione variante - Opere edili				Jun 18, 2024 8:33 AM	Jun 20, 2024 4:34 PM	1	1	0	
OPEN	773	lattonerie porte e portoni	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili		Pietro Canesi	Jun 22, 2024	Jun 12, 2024 3:30 PM	--	2	--	--	

Showing 1 - 20 of 533

Export (533) filtered

PM
expo
2024

Istituto Italiano di
Project Management

presenta:
PMexpo
Roma, 4 Ottobre 2024

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca
sistema in
di gesti
dell'inform

effic
proc

AUTODESK Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification B

Michele Carradori (Contec)

Filters: Reviews, Transmittals, Issues

Reviews Archived reviews

Filter Search by review name, ID Export (533) filtered

You are viewing reviews with filters/search applied. Clear all

	Status	ID	Review name	Workflow	Initiated by	Next action by	Next action due	Created on	Finished on	Documents	Approved	Rejected	Progress
☐	CLOSED	828	Invio schede tecniche trattamento antioilo	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	--	--	--	Sep 24, 2024 12:46 PM	Sep 26, 2024 6:02 PM	2	2	0	
☐	CLOSED	827	INSEGNE REV.1	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Sep 23, 2024 10:50 AM	Sep 30, 2024 11:37 AM	2	2	0	
☐	OPEN	803	Variante lattonerie impianti lato OVEST	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--	
☐	OPEN	802	Variante maggior peso scale	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--	
☐	CLOSED	800	Emissione versione 0 Progetto costruttivo carpen...	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jul 26, 2024 5:30 PM	Jul 29, 2024 6:07 PM	6	6	0	
☐	OPEN	799	CERTIFICAZIONE DOP-CE PORTE US	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 5, 2024	Jul 26, 2024 8:37 AM	--	--	5	--	--	
☐	OPEN	798	VAR 62 - elettrificazione porte	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 4, 2024	Jul 25, 2024 10:32 AM	--	--	1	--	--	
☐	OPEN	796	Variante braccetti chiudiporta	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 3, 2024	Jul 24, 2024 2:45 PM	--	--	1	--	--	
☐	CLOSED	775	Progetto vasca bianca - Rev.01	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jun 20, 2024 3:42 PM	Jun 28, 2024 11:27 AM	1	1	0	
☐	CLOSED	774	Attività pavimentazione tettoia fumatori est	Richiesta approvazione variante - Opere edili	--	--	--	Jun 18, 2024 8:33 AM	Jun 20, 2024 4:34 PM	1	1	0	
☐	OPEN	773	lattonerie porte e portoni	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	Pietro Canesi	Jun 22, 2024	Jun 12, 2024 3:30 PM	--	--	2	--	--	

Showing 1 - 20 of 533

1 of 27

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca
sistema in
di gesti
dell'inform

efficace
processo

AUTODESK Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification B - Michele Carradori (Contec)

Filters: Reviews, Transmittals, Issues

Reviews Archived reviews

Filter Search by review name, ID Export (533) filtered

You are viewing reviews with filters/search applied. Clear all

	Status	ID	Review name	Workflow	Initiated by	Next action by	Next action due	Created on	Finished on	Documents	Approved	Rejected	Progress
☐	CLOSED	828	Invio schede tecniche trattamento antioilo	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	--	--	--	Sep 24, 2024 12:46 PM	Sep 26, 2024 6:02 PM	2	2	0	
☐	CLOSED	827	INSEGNE REV.1	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Sep 23, 2024 10:50 AM	Sep 30, 2024 11:37 AM	2	2	0	
☐	OPEN	803	Variante lattonerie impianti lato OVEST	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--	
☐	OPEN	802	Variante maggior peso scale	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--	
☐	CLOSED	800	Emissione versione 0 Progetto costruttivo carpen...	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jul 26, 2024 5:30 PM	Jul 29, 2024 6:07 PM	6	6	0	
☐	OPEN	799	CERTIFICAZIONE DOP-CE PORTE US	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 5, 2024	Jul 26, 2024 8:37 AM	--	--	5	--	--	
☐	OPEN	798	VAR 62 - elettrificazione porte	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 4, 2024	Jul 25, 2024 10:32 AM	--	--	1	--	--	
☐	OPEN	796	Variante braccetti chiudiporta	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 3, 2024	Jul 24, 2024 2:45 PM	--	--	1	--	--	
☐	CLOSED	775	Progetto vasca bianca - Rev.01	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jun 20, 2024 3:42 PM	Jun 28, 2024 11:27 AM	1	1	0	
☐	CLOSED	774	Attività pavimentazione tettoia fumatori est	Richiesta approvazione variante - Opere edili	--	--	--	Jun 18, 2024 8:33 AM	Jun 20, 2024 4:34 PM	1	1	0	
☐	OPEN	773	lattonerie porte e portoni	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	Pietro Canesi	Jun 22, 2024	Jun 12, 2024 3:30 PM	--	--	2	--	--	

Showing 1 - 20 of 533

1 of 27

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

manca
sistema in
di gesti
dell'inform

efficace
processo

AUTODESK Construction Cloud

Document Management - 2479 - Franke - Main modification

Michele Carradori (Contec)

Filters: Reviews, Transmittals, Issues

Reviews Archived reviews

Filter Search by review name, ID

Export (533) filtered

You are viewing reviews with filters/search applied. [Clear all](#)

☐	Status	ID	Review name	Workflow	Initiated by	Next action by	Next action due	Created on	Finished on	Documents	Approved	Rejected	Progress	
☐	CLOSED	828	Invio schede tecniche trattamento antioilo	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	--	--	--	Sep 24, 2024 12:46 PM	Sep 26, 2024 6:02 PM	2	2	0		
☐	CLOSED	827	INSEGNE REV.1	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Sep 23, 2024 10:50 AM	Sep 30, 2024 11:37 AM	2	2	0		
☐	OPEN	803	Variante lattonerie impianti lato OVEST	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--		
☐	OPEN	802	Variante maggior peso scale	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 11, 2024	Aug 1, 2024 3:14 PM	--	--	1	--	--		
☐	CLOSED	800	Emissione versione 0 Progetto costruttivo carpen...	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jul 26, 2024 5:30 PM	Jul 29, 2024 6:07 PM	6	6	0		
☐	OPEN	799	CERTIFICAZIONE DOP-CE PORTE US	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 5, 2024	Jul 26, 2024 8:37 AM	--	--	5	--	--		
☐	OPEN	798	VAR 62 - elettrificazione porte	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 4, 2024	Jul 25, 2024 10:32 AM	--	--	1	--	--		
☐	OPEN	796	Variante braccetti chiudiporta	Richiesta approvazione variante - Opere edili	DL - Opere Edili...	Aug 3, 2024	Jul 24, 2024 2:45 PM	--	--	1	--	--		
☐	CLOSED	775	Progetto vasca bianca - Rev.01	Richiesta approvazione tecnica - Strutture	--	--	--	Jun 20, 2024 3:42 PM	Jun 28, 2024 11:27 AM	1	1	0		
☐	CLOSED	774	Attività pavimentazione tettoia fumatori est	Richiesta approvazione variante - Opere edili	--	--	--	Jun 18, 2024 8:33 AM	Jun 20, 2024 4:34 PM	1	1	0		
☐	OPEN	773	lattonerie porte e portoni	Richiesta approvazione tecnica - Opere edili	Pietro Canesi	Jun 22, 2024	Jun 12, 2024 3:30 PM	--	--	2	--	--		

Showing 1 - 20 of 533

1 of 27 > >>

CDE **perché è così importante necessario?**

ACDat

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione



gestione
DOCUMENTALE

gestione delle
COMUNICAZIONI

gestione dei
FLUSSI APPROVATIVI

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO EDILIZIO



produce
oggetti unici



è basato sulla
competitività
piuttosto che sulla
collaborazione



manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'**informazione**



è soggetto a
forti ciclicità



tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese




scarsi investimenti
in **research & development**

→ **ACDat** [CDE] ←

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO EDILIZIO



produce
oggetti unici



è basato sulla
competitività
piuttosto che sulla
collaborazione



manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione



è soggetto a
forti ciclicità



tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese




scarsi investimenti
in **research & development**

→ **ACDat** [CDE] ←

CDE perché è così importante necessario?

ACDat

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO EDILIZIO



N.B.: "The structured use of a CDE requires **strict discipline** by all members of a design team in terms of adherence to **agreed approaches and procedures**, compared with a more traditional approach."

PAS 1192-2:2013, § 9.2, p. 25

produce
oggetti unici

è basato sulla
competitività
piuttosto che sulla
collaborazione

manca di un
sistema integrato
di **gestione**
dell'informazione

è soggetto a
forti ciclicità

tessuto
professionale
fatto da **molte**
microimprese

scarsi investimenti
in **research &
development**

→ **ACDat** [CDE] ←

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



presenta:

PMexpo

Roma, 4 Ottobre 2024
